CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA-RN

OBRA: USINAS SOLARES EM COBERTURAS

LOCAL: PRÉDIOS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CRUZETA/RN

	RESUMO		
ITEM	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS		TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	5,200.00
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$	142,188.66
3	LOCAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA	R\$	30,582.00
	~		
4	MATERIAL DE INFRA E SUPERESTRUTURA - INSTALAÇÃO	R\$	87,022.14
_		DΦ	70 700 00
5	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOVOLTÁICA	R\$	73,700.32
6	EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOVOLTÁICA	R\$	635,620.48
O	EQUIFAIVIENTOS FARA SISTEIVIA DE IVIIIVIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA	ĽΦ	033,020.46
7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	110,400.00
•	DERVISO DE INCIMENSAC DE ESCALAMIENTO	ΤΨ	110,100.00
	TOTAL SEM B.D.I	. R\$	1,084,713.60
	TOTAL COM B.D.I.(30,50%		1,415,551.25

CLIENT PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA-RN OBRA: USINAS SOLARES EM COBERTURAS LOCAL: PRÉDIOS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CRUZETA/RN

LOCAL.		D MUNICIPIO DA CIDADE DE CRUZETA/RN ORÇAMEN	OTI							
ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PR	FCO UN	PRF	ÇO TOTAL		TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	1	<u> </u>				100 101712	R\$	5,200.00
1.1	SINAPI	PLACA DE OBRA 200 x 120	UND	8	R\$	650.00	R\$	5.200.00		
		, = =						-,		
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$	142,188.66
2.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1	R\$	56,748.66	R\$	56,748.66		<u>, </u>
2.2	COMP 02	DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	UND	1	R\$	85,440.00	R\$	85,440.00		
		•						•		
3		LOCAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA							R\$	30,582.00
3.1	COMP 03	LOCAÇÃO DE ANDAIMES IVIANTELETE OU KOIVIFEDON FINEOIVIATICO IVIANOAL, 28 KG, COIVI	UN	1	R\$	28,800.00	R\$	28,800.00		
3.2	53863	CIL FNOLADOD	Н	1080	R\$	1.65	R\$	1,782.00		
		7								
4		MATERIAL DE INFRA E SUPERESTRUTURA - INSTALAÇÃO							R\$	87,022.14
4.1		ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 2"	UND	126	R\$	22.90	R\$	2,885.40		
4.2	ORÇADO	CURVA PVC 2"	UND	114	R\$	6.90	R\$	786.60		
4.3	ORÇADO	ABRAÇADEIRA 2"	UND	228	R\$	5.00	R\$	1,140.00		
4.4	ORÇADO	CABO 16mm PRETO	MTS	882	R\$	29.90	R\$	26,371.80		
4.5	ORÇADO	CABO 16mm AZUL	MTS	294	R\$	23.90	R\$	7,026.60		
4.6	ORÇADO	CABO 16mm VERDE	MTS	198	R\$	23.90	R\$	4,732.20		
4.7	ORÇADO	CABO 25mm XLPE PRETO	MTS	120	R\$	15.00	R\$	1,800.00		
4.8	ORÇADO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UND	24	R\$	145.00	R\$	3,480.00		
4.9		PRENSA CABO 1"	UND	24	R\$	8.50	R\$	204.00		
4.10		CONECTOR PINO 16mm	UND	240	R\$	3.40	R\$	816.00		
4.11	ORÇADO	CONECTOR PINO 4mm	UND	108	R\$	1.00	R\$	108.00		
4.12	ORÇADO	CONECTOR OLHAL 16mm	UND	120	R\$	4.20	R\$	504.00		
4.13	ORÇADO	CONECTOR OLHAL 4mm	UND	300	R\$ R\$	1.20	R\$ R\$	360.00		
4.14	ORÇADO	PARAFUSO 12mm	UND	144	R\$	0.96	R\$	138.24		
4.15	ORÇADO	BUCHA 12mm	UND	144		0.80		115.20		
4.16	ORÇADO ORÇADO	PARAFUSO 8mm	UND	1050 1050	R\$ R\$	0.26 0.25	R\$ R\$	273.00 262.50		
4.17 4.18	ORÇADO	BUCHA 8mm CAIXA PARA 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO		1050	R\$	39.90	R\$	718.20		
4.16	ORÇADO	CAIXA PARA 1 DISJUNTOR TRIFASICO CAIXA DE PASSAGEM 15X15	UND	162	R\$	39.90	R\$	4,941.00		
4.19	ORÇADO	ESPIRAL DE ACABAMENTO 1"	UND	30	R\$	11.90	R\$	357.00		
4.21	ORÇADO	ABRAÇADEIRA DE NYLON 100X240	PCT	30	R\$	21.90	R\$	657.00		
4.22	ORÇADO	MANTA ASFÁLTICA	MTS	660	R\$	39.90	R\$	26,334.00		
4.23	ORÇADO	VEDA CALHA CINZA	UND	126	R\$	23.90	R\$	3,011.40		
4.20	ORÇADO	VEDA CALITA CINZA	OND	120	ΙζΨ	20.00	ΙζΨ	5,011.40		
		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO								
5		FOTOVOLTÁICA							R\$	73,700.32
5.1	ORÇADO	CABO CC VERMELHO	MTS	1536	R\$	4.08	R\$	6,266.88		
5.2	ORÇADO	CABO CC PRETO	MTS	1536	R\$	4.08	R\$	6,266.88		
5.3	ORÇADO	CABO CC VERDE	MTS	512	R\$	6.45	R\$	3,302.40		
5.4	ORÇADO	PERFIL SUPORTE ALUMINIO 4,80M 2P	UND	256	R\$	119.85	R\$	30,681.60		
5.5	ORÇADO	CLAMP FINAL AJUSTÁVEL 2P	UND	160	R\$	7.22	R\$	1,155.20	Ì	
5.6	ORÇADO	CLAMP INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL 2P	UND	1200	R\$	6.00	R\$	7,200.00		
5.7		PARAFUSO ESTRUTURAL INOX 2P	UND	768	R\$	23.62	R\$	18,140.16		
5.8	ORÇADO	CONECTOR MC4	PAR	80	R\$	8.59	R\$	687.20		
	-									

CLIENT PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA-RN
OBRA: USINAS SOLARES EM COBERTURAS
LOCAL: PRÉDIOS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CRUZETA/RN

	ORÇAMENTO										
ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PRE	ÇO UN.	PRE	EÇO TOTAL		TOTAL	
6		EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOVOLTÁICA							R\$	635,620.48	
6.1	ORÇADO	INVERSOR GROWATT MID 25KTL3-X OU SIMILAR	UND	8	R\$	5,852.56	R\$	46,820.48			
6.2	ORÇADO	MÓDULOS SUNOVA SS-550-72MDH	UND	512	R\$	1,150.00	R\$	588,800.00			
7		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							R\$	110,400.00	
7.1	ORÇADO	INSTALAÇÃO DE MÓDULO	UND	512	R\$	200.00	R\$	102,400.00			
7.2	ORÇADO	INSTALAÇÃÕO DE INVERSOR	UND	8	R\$	1,000.00	R\$	8,000.00			

TOTAL GERAL SEM BDI	R\$	1,084,713.60
TOTAL GERAL COM BDI (30,50%)	R\$	1,415,551.25

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA-RN
OBRA: USINAS SOLARES EM COBERTURAS
LOCAL: PRÉDIOS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CRUZETA/RN

	COMPOSIÇÕES									
CON	COMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
SERVIÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	COEFICIENTE	V. UNIT	,	V. TOTAL		
	100320	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	1.0	R\$ 20,542.85	R\$	20,542.85		
	88266	ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	176	1.0	R\$ 23.60	R\$	4,153.60		
	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	1.0	R\$ 3,460.51	R\$	3,460.51		
	101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	2.0	R\$ 4,703.44	R\$	9,406.88		
	101375	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	1.0	R\$ 3,890.93	R\$	3,890.93		
	101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	1.0	R\$ 4,224.32	R\$	4,224.32		
	101387	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	2.0	R\$ 3,473.70	R\$	6,947.40		
	101436	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	1.0	R\$ 4,122.17	R\$	4,122.17		
	VALOR TOTAL:									

CON	/IP 02	DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM							UND: L
SERVIÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	COEFICIENTE	V.	. UNIT	٧	. TOTAL
	ORÇADO	GASOLINA	L	450	4.0	R\$	5.80	R\$	10,440.00
	ORÇADO	ALIMENTAÇÃO	UN	30	10.0	R\$	40.00	R\$	12,000.00
	ORÇADO	HOSPEDAGEM	DIA	30	10.0	R\$	210.00	R\$	63,000.00
	VALOR TOTAL:						R\$	85.440.00	

CC	MP 03	LOCAÇÃO DE ANDAIMES							UND: R\$
SERVIÇ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	QTD. DIAS	٧.	UNIT	٧	. TOTAL
	ORÇADO	Locação de Andaimes 1,5 M	UN	20	60	R\$	12.00	R\$	14,400.00
	ORÇADO	Locação de Sapatas Reguláveis	UN	8	60	R\$	12.00	R\$	5,760.00
	ORÇADO	Locação de Diagonais	UN	12	60	R\$	12.00	R\$	8,640.00
				·					
	VALOR TOTAL:					R\$	28,800.00		

CLIENTE: PREFEITURA MUNIIPAL DE CRUZETA-RN OBRA:

USINAS SOLARES EM COBERTURAS PRÉDIOS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CRUZETA/RN LOCAL:

MEMORIAL DE CÁLCULO

PLACA DE OBRA 200 x 120							
ARGURA (m ALTURA (m) QTD. (Un.) ÁREA (m²)							
2.00	1.20	8	19.20				
	TOTAL 19.20						

CABO CC VERMELHO 4MM - 1,8KV						
QTD. DE PLACAS	QDT DE MEDIA DE CABO POR PLACA(m)	QTD TOTAL DE CABO(m)				
512.00	3.00	1536				
	TOTAL	1536.00				

CABO CC PRETO 4MM - 1,8KV						
QTD. DE PLACAS	QDT DE MEDIA DE CABO POR PLACA(m)	QTD TOTAL DE CABO(m)				
512.00	3.00	1536				
	TOTAL	1536.00				

	CABO CC VERDE/AMARELO 6MM - 1,8KV						
QTD. DE PLACAS	QDT DE MEDIA DE CABO POR PLACA(m)	QTD TOTAL DE CABO(m)					
512.00	1.00	512					
	TOTAL	512.00					

	PERFIL SUPORTE ALUMINIO 4,80M - 2P ACESSÓRIOS							
QTD. DE PLACAS	QDT DE MEDIA DE PERFIL POR PLACA(m)	TAMANHO DO PERFIL(m)	QDT DE TOTAL DE PERFIL					
512	2.4	4.80	256.00					
	TOTAL 256.00							

CLAMP FINAL AJUSTAVÉL - 2P ACESSÓRIOS						
QTD. DE MESAS COM 14 PLACAS CADA.	QTD. NECESSÁRIA DE CLAP POR MESA					
40.00	4.00					
	TOTAL	160.00				

CLAMP INTERMÉDIARIO 35/40MM- 2P ACESSÓRIOS						
QTD. DE MESAS COM 14 PLACAS CADA.	QTD. NECESSÁRIA DE CLAP POR MESA					
40.00	30.00					
	TOTAL	1200.00				

PARAFUSO ESTRUTURAL INOX M10X200MM - 2P ACESSÓRIOS						
QTD. DE PERFIL	PARAFUSO POR	QTD TOTAL DE PERFIL				
256.00	3.00	768				
TOTAL		768.00				

CURVA ABC										
LASS	ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PR	EÇO UN.		TOTAL	%	% Acumulada
Α	6.2	MÓDULOS SUNOVA SS-550-72MDH	UND	512	R\$	1,150.00	R\$	588,800.00	54.282%	54.282%
Α	7.1	INSTALAÇÃO DE MÓDULO	UND	512	R\$	200.00	R\$	102,400.00	9.440%	63.722%
Α	2.2	DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	UND	1	R\$	85,440.00	R\$	85,440.00	7.877%	71.599%
Α	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1	R\$	56,748.66	R\$	56,748.66	5.232%	76.830%
Α	6.1	INVERSOR GROWATT MID 25KTL3-X OU SIMILAR	UND	8	R\$	5,852.56	R\$	46,820.48	4.316%	81.147%
В	5.4	PERFIL SUPORTE ALUMINIO 4,80M 2P	UND	256	R\$	119.85	R\$	30,681.60	2.829%	83.975%
В	3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	UN	1	R\$	28,800.00	R\$	28,800.00	2.655%	86.630%
В	4.4	CABO 16mm PRETO	MTS	882	R\$	29.90	R\$	26,371.80	2.431%	89.062%
В	4.22	MANTA ASFÁLTICA	MTS	660	R\$	39.90	R\$	26,334.00	2.428%	91.489%
В	5.7	PARAFUSO ESTRUTURAL INOX 2P	UND	768	R\$	23.62	R\$	18,140.16	1.672%	93.162%
В	7.2	INSTALAÇÃÕO DE INVERSOR	UND	8	R\$	1,000.00	R\$	8,000.00	0.738%	93.899%
В	5.6	CLAMP INTERMEDIÁRIO AJUSTÁVEL 2P	UND	1200	R\$	6.00	R\$	7,200.00	0.664%	94.563%
В	4.5	CABO 16mm AZUL	MTS	294	R\$	23.90	R\$	7,026.60	0.648%	95.211%
В	5.1	CABO CC VERMELHO	MTS	1536	R\$	4.08	R\$	6,266.88	0.578%	95.788%
С	5.2	CABO CC PRETO	MTS	1536	R\$	4.08	R\$	6,266.88	0.578%	96.366%
С	1.1	PLACA DE OBRA 200 x 120	UND	8	R\$	650.00	R\$	5,200.00	0.479%	96.846%
С	4.19	CAIXA DE PASSAGEM 15X15	UND	162	R\$	30.50	R\$	4,941.00	0.456%	97.301%
С	4.6	CABO 16mm VERDE	MTS	198	R\$	23.90	R\$	4,732.20	0.436%	97.737%
С	4.8	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UND	24	R\$	145.00	R\$	3,480.00	0.321%	98.058%
С	5.3	CABO CC VERDE	MTS	512	R\$	6.45	R\$	3,302.40	0.304%	98.363%
С	4.23	VEDA CALHA CINZA	UND	126	R\$	23.90	R\$	3,011.40	0.278%	98.640%
С	4.1	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 2"	UND	126	R\$	22.90	R\$	2,885.40	0.266%	98.906%
С	4.7	CABO 25mm XLPE PRETO	MTS	120	R\$	15.00	R\$	1,800.00	0.166%	99.072%
С	3.2	INANTELETE OU KOMPEDOK PINEUMATICO MANUAL, 20 KG, COM	Н	1080	R\$	1.65	R\$	1,782.00	0.164%	99.236%
С	5.5	CLAMP FINAL AJUSTÁVEL 2P	UND	160	R\$	7.22	R\$	1,155.20	0.106%	99.343%
С	4.3	ABRAÇADEIRA 2"	UND	228	R\$	5.00	R\$	1,140.00	0.105%	99.448%
С	4.10	CONECTOR PINO 16mm	UND	240	R\$	3.40	R\$	816.00	0.075%	99.523%
С		CURVA PVC 2"	UND	114	R\$	6.90	R\$	786.60	0.073%	99.596%
С	4.18	CAIXA PARA 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO	UND	18	R\$	39.90	R\$	718.20	0.066%	99.662%
С		CONECTOR MC4	PAR	80	R\$	8.59	R\$	687.20	0.063%	99.725%
С		ABRAÇADEIRA DE NYLON 100X240	PCT	30	R\$	21.90	R\$	657.00	0.061%	99.786%
С		CONECTOR OLHAL 16mm	UND	120	R\$	4.20	R\$	504.00	0.046%	99.832%
С		CONECTOR OLHAL 4mm	UND	300	R\$	1.20	R\$	360.00	0.033%	99.866%
С		ESPIRAL DE ACABAMENTO 1"	UND	30	R\$	11.90	R\$	357.00	0.033%	99.899%
С		PARAFUSO 8mm	UND	1050	R\$	0.26	R\$	273.00	0.025%	99.924%
С		BUCHA 8mm	UND	1050	R\$	0.25	R\$	262.50	0.024%	99.948%
С		PRENSA CABO 1"	UND	24	R\$	8.50	R\$	204.00	0.019%	99.967%
С		PARAFUSO 12mm	UND	144	R\$	0.96	R\$	138.24	0.013%	99.979%
С		BUCHA 12mm	UND	144	R\$	0.80	R\$	115.20	0.011%	99.990%
С		CONECTOR PINO 4mm	UND	108	R\$	1.00	R\$	108.00	0.010%	100.000%
	TOTAL GERAL SEM BD						R\$	1,084,713.60		
		TOTAL GE	DAI C	OM P	וח י	(30 50%)	R\$	1,415,551.25		-

CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CRUZETA-RN

OBRA: USINAS SOLARES EM COBERTURAS

LOCAL: PRÉDIOS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CRUZETA/RN

	COMPOSIÇÃO DO BDI						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SIGLAS	Percentual %				
1	TAXA DE ADMISSÃO CENTRAL	AC	4.67%				
2	TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO						
2.1	Seguro + Garantia	S+G	0.74%				
2.2	Risco	R	0.95%				
3	TAXA DE TRIBUTOS - LUCRO PRESUMIDO		10.35%				
3.1	PIS		0.65%				
3.2	CONFINS	Т	3.00%				
3.3	ISS (BASE DE CÁLCULO)		3.00%				
3.4	CPRB (INSS)		3.70%				
4	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1.20%				
5	TAXA DE LUCRO	L	8.69%				
	BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-T))-1 BDI Resultante 30.50%						

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA-RN
OBRA: USINAS SOLARES EM COBERTURAS
LOCAL: PREDIOS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CRUZETA/RN

	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
ITEM	ITEM ESPECIFICAÇÃO		VALOR TOTAL / MÊS		1 MÊS		2 MÊS			3 MÊS		
			(R\$)		Valor (R\$)	Perc. %		Valor (R\$)	Perc. %		Valor (R\$)	Perc. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	5,200.00	R\$	5,200.00	100.00%	R\$	-	0.00%	R\$	-	0.00%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$	142,188.66	R\$	47,348.82	33.30%	R\$	47,348.82	33.30%	R\$	47,491.01	33.40%
3	LOCAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA	R\$	30,582.00	R\$	30,582.00	100.00%	R\$	-	0.00%	R\$	-	0.00%
4	MATERIAL DE INFRA E SUPERESTRUTURA - INSTALAÇÃO	R\$	87,022.14	R\$	28,978.37	33.30%	R\$	28,978.37	33.30%	R\$	29,065.39	33.40%
5	SISTEMA DE MINIGERAÇÃO	R\$	73,700.32	R\$	24,542.21	33.30%	R\$	24,542.21	33.30%	R\$	24,615.91	33.40%
6	EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOVOLTÁICA	R\$	635,620.48	R\$	211,661.62	33.30%	R\$	211,661.62	33.30%	R\$	212,297.24	33.40%
7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	110,400.00	R\$	36,763.20	33.30%	R\$	36,763.20	33.30%	R\$	36,873.60	33.40%
	TOTAL SIMPLES	R\$	1,084,713.60	R\$	385,076.22	35.5003%		349,294.22	32.2015%		350,343.15	32.2982%
	TOTAL ACUMULADO	R\$	-	R\$	385,076.22	35.5003%	R\$	734,370.45	67.7018%	R\$	1,084,713.60	100.0000%
	TAL SIMPLES COM BDI (30,50%)	R\$	1,415,551.25	R\$	502,524.47	35.5003%		455,828.96	32.2015%	R\$	457,197.82	32.2982%
TOTA	AL ACUMULADO COM BDI (30,50%)	R\$		R\$	502,524.47	35.5003%	R\$	958,353.43	67.7018%	R\$	1,415,551.25	100.00%

DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO DOS PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO DA CIDADE DE CRUZETA/RN.

1-CONSUMO DE ENRGIA DO MUNICIPIO DE CRUZETA/RN:

Após o levantamento de todos as contas de consumo de energia dos prédios de domínio publico município de Cruzeta/RN, concluímos que o consumo médio mensal destes prédios ultrapassa 31.000,00KWH/MÊS. Historicamente o consumo de energia elétrica no Brasil sempre aumenta em torno de 2,5% ao ano portanto recomendamos para o município de cruzeta um sistema um sistema que gere no mínimo 36.000,00KWH/MÊS.

2-DIMENSIONEMTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO:

Levando em consideram que 1 KWP de potencia de um gerador fotovoltaico na região de CRUZETA/RN gera em torno de 130kwh/mês de energia elétrica para suprir a necessidade de todo o município seria necessário um sistema de potencia mínima de 280KWP pois o mesmo chegaria a geração de no mínimo 36.400,00KWH/MÊS.


Para chegar a essa potencia dimensionamos 08 sistemas com 64 módulos de 550w a potencia de cada sistema ficou de 35,2kwp. A soma dos 08 sistemas chega 281,6KWP o suficiente para gera os 36.000,00KWH/MÊS.


3-LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS O8 SISTEMA DE GERAÇÃO DE NERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:

Após vistas aos prédios públicos do município, identificamos os prédios com área de cobertura suficientes para instalação dos sistemas, são eles:

- -SECRETERIA DE EDUCAÇÃO, Localizado na Rua Tiburtino Bezerra n-02, Bairro Santo Antonio;
- -CENTRO DE ED. INFANTIL JOAQUIM L PEQ, Localizado na Rua Tiburtino Bezerra n-175, Bairro Santo Antonio;
- -ESCOLA ANA ASSIS DE MEDEIROS, Localizado na Rua Abilio Cordula n-14, Bairro Novo Horizonte;
- -ESCOLA CONEGO AMBROSIO SILVA, Localizado na Pç Cicero Simão Bezerra n-03, Bairro Centro;
- -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Localizado na Rua Pedro Vital n-102 Bairro Novo Horizonte;
- -CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, Localizado na Rua Dr. Silvio Bezerra de Melo n-17 Bairro Centro;
- -HOSPITAL PUBLICO DE CRUZETA, Localizado na Rua Teotonio Guerra s/n, Bairro Novo Horizonte;
- -CLUBE MUNICIPAL DE CRUZETA, LOCALIZADO NA PÇ Dr. Pedro Etelvino de Goes n-01, centro.

Danilo Fontes de Lima Electrotécnico CFT: 4810504/2022

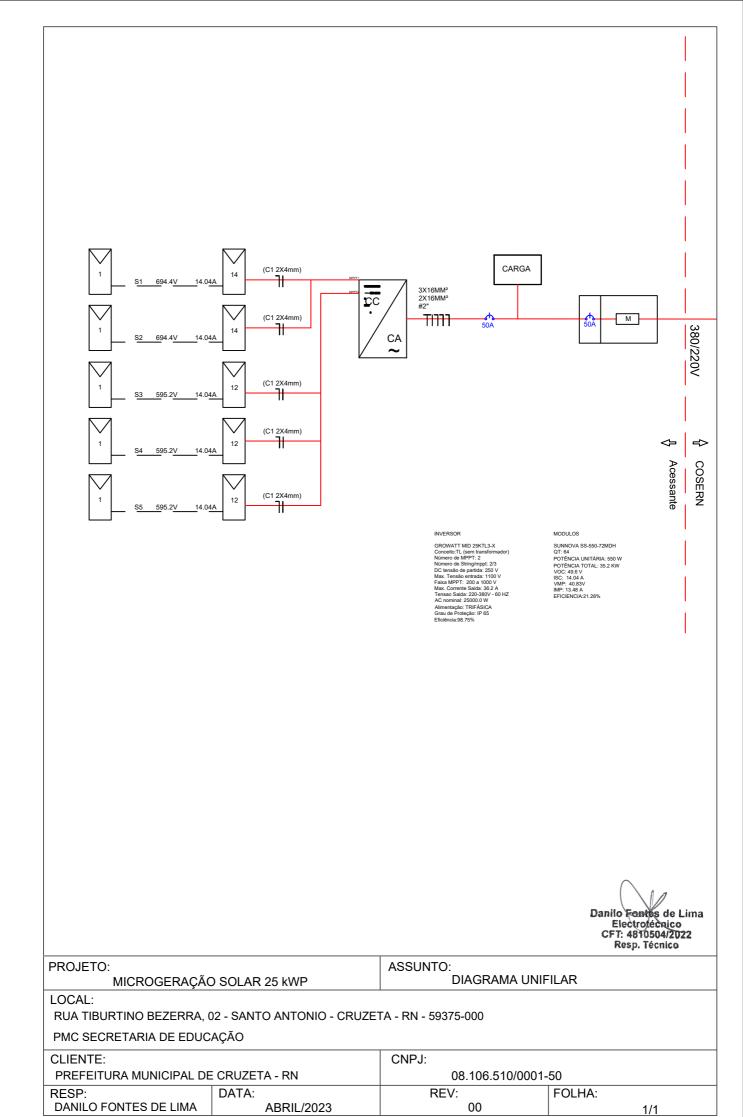

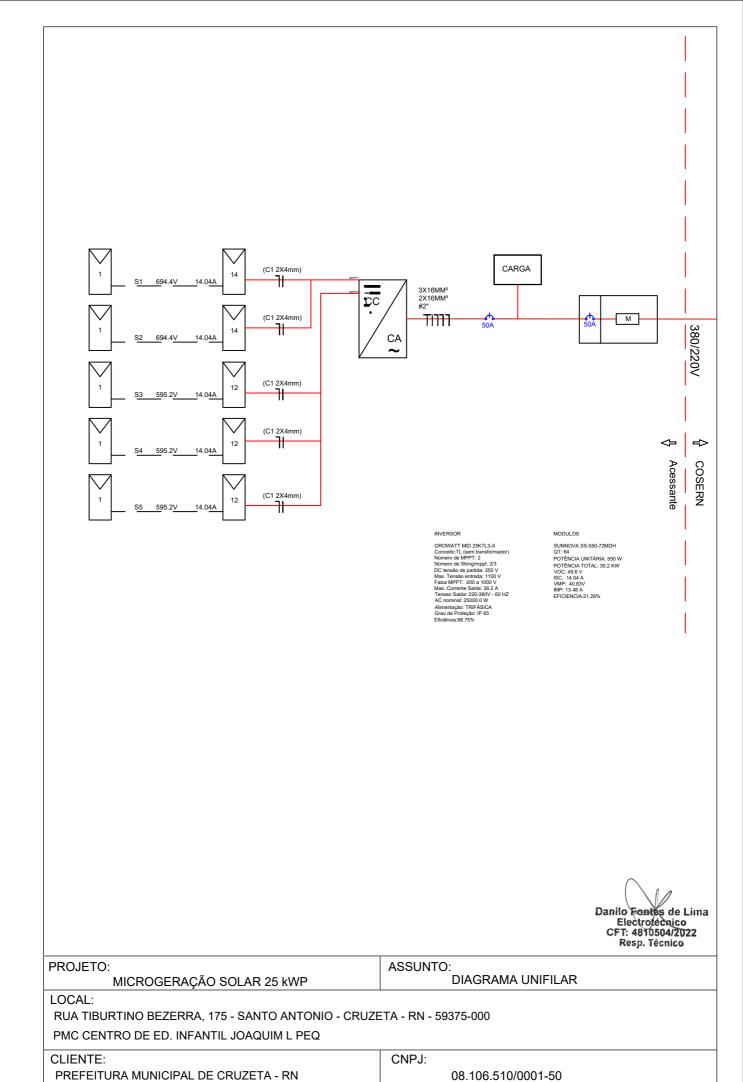

REV:

00

FOLHA:


1/1

RESP:


DANILO FONTES DE LIMA

DATA:

ABRIL/2023

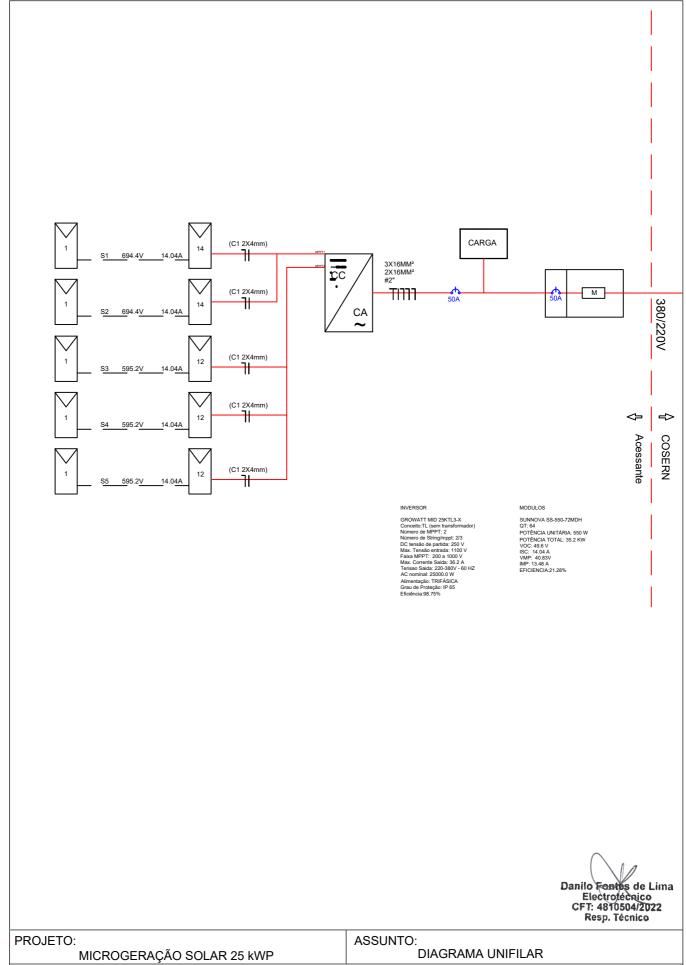

MICROGERAÇÃO	O SOLAR 25 kWP	DIAGRAMA UNIF	FILAR				
LOCAL:							
RUA ABILIO CORDULA, 14 - NOVO HORIZONTE - CRUZETA - RN - 59375-000							
ESCOLA ANA ASSIS DE MEDEIROS							
CLIENTE:	CLIENTE: CNPJ:						
PREFEITURA MUNICIPAL DE	E CRUZETA - RN	08.106.510/0001-	50				
RESP:	DATA:	REV:	FOLHA:				
DANILO FONTES DE LIMA	ABRIL/2023	00	1/1				

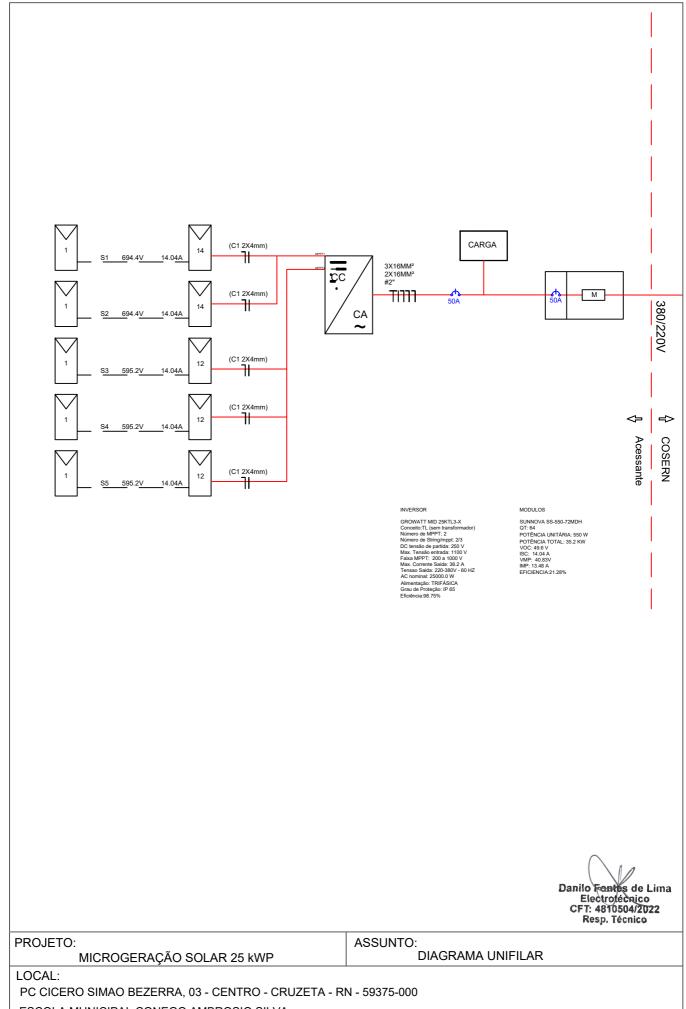


MICROGERAÇÃO SOLAR 25 KWP


LOCAL:
PC CICERO SIMAO BEZERRA, 03 - CENTRO - CRUZETA - RN - 59375-000
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO AMBROSIO SILVA


CLIENTE:
CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA - RN
08.106.510/0001-50

RESP:
DATA:
REV:
FOLHA:
DANILO FONTES DE LIMA
ABRIL/2023
00
1/1

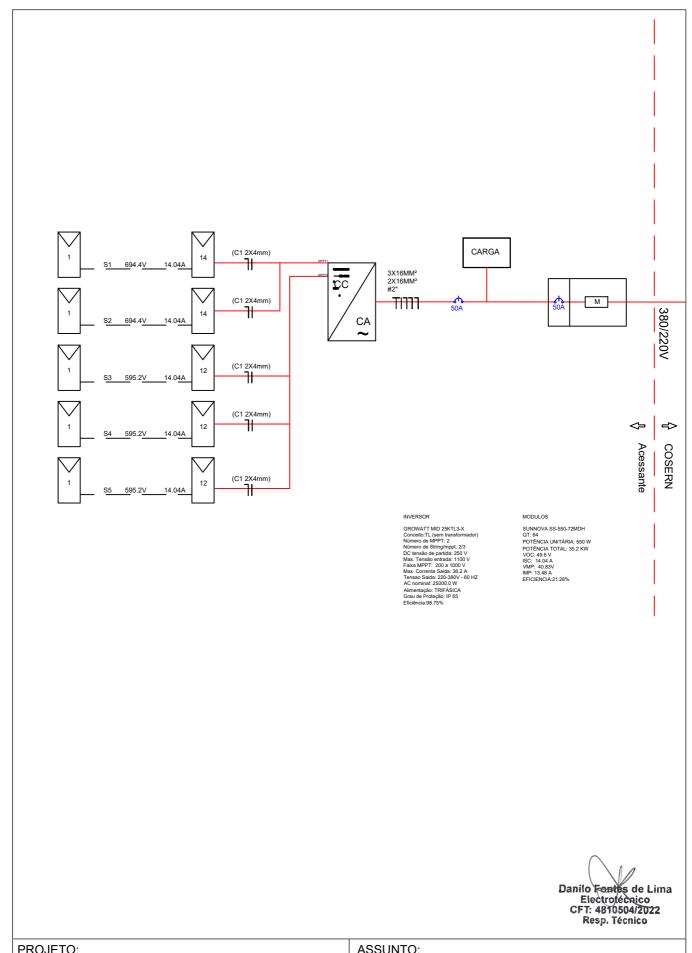


PROJETO:		ASSUNTO:						
MICROGERAÇ	ÃO SOLAR 25 kWP	DIAGRAMA UNIFILAR						
LOCAL:								
RUA PEDRO VITAL, 102 -	RUA PEDRO VITAL, 102 - NOVO HORIZONTE - CRUZETA - RN - 59375-000							
SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
CLIENTE:	CLIENTE: CNPJ:							
PREFEITURA MUNICIPAL	DE CRUZETA - RN	08.106.510/0001-50						
RESP:	DATA:	REV:	FOLHA:					
DANILO FONTES DE LIMA	ABRIL/2023	00	1/1					

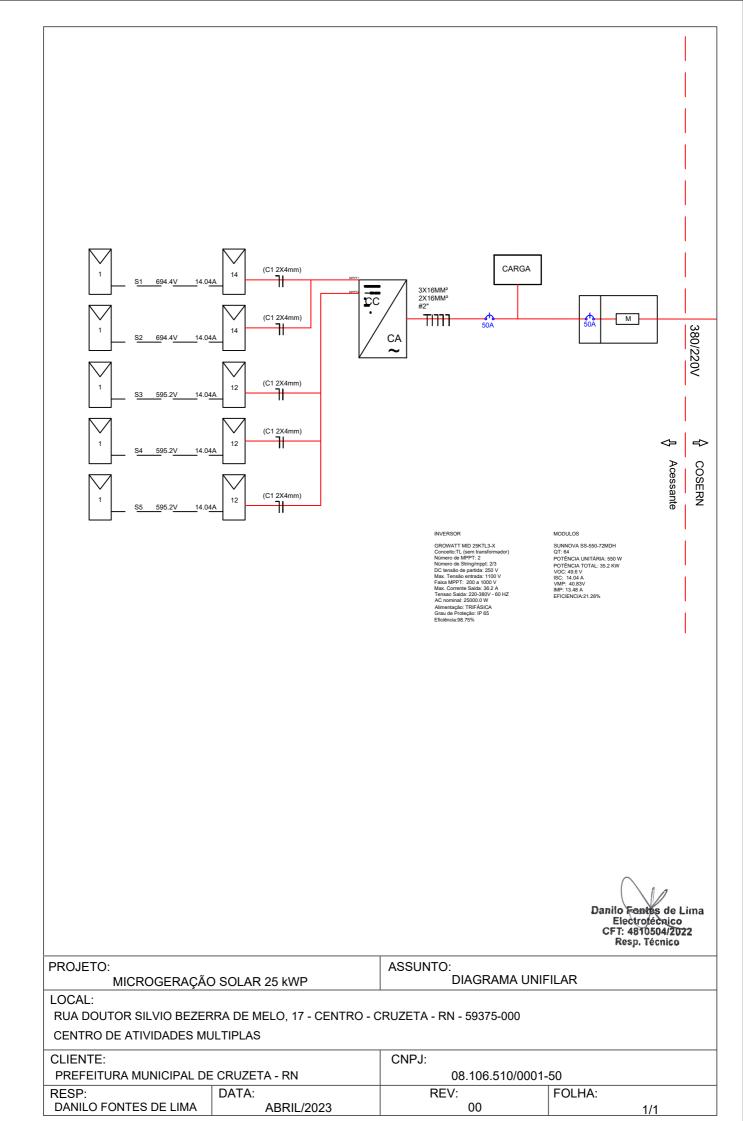

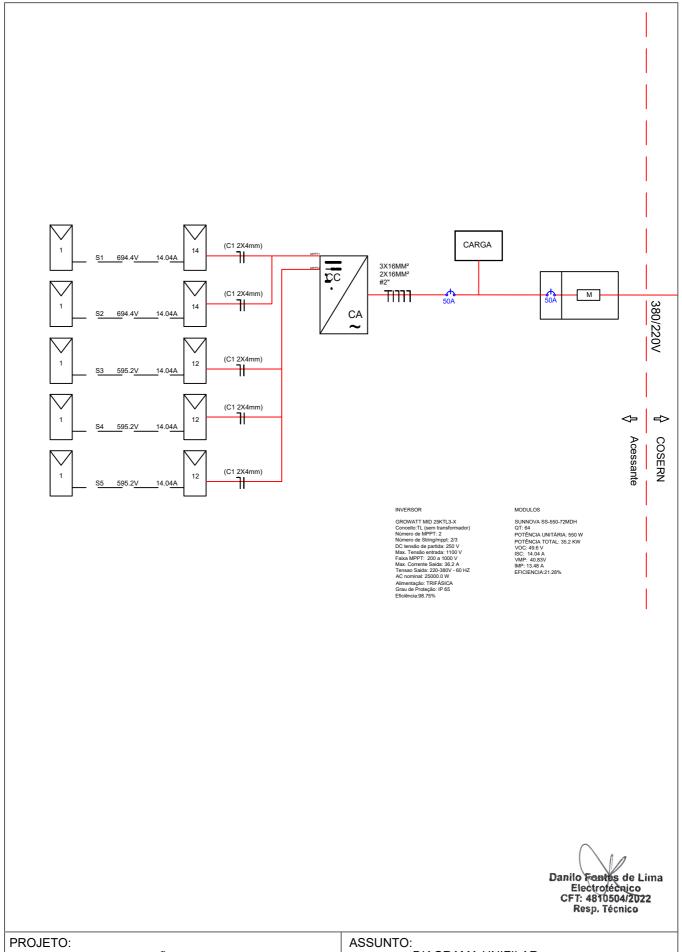

FINOSETO.		ASSUNTO.						
MICROGERAÇÃO) SOLAR 25 kWP	DIAGRAMA U	NIFILAR					
LOCAL:								
RUA TEOTONIO GUERRA, 1 SN - NOVO HORIZONTE - CRUZETA - RN - 59375-000								
HOSPITAL PUBLICO DE CRUZETA								
CLIENTE:	CLIENTE: CNPJ:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE	CRUZETA - RN	08.106.510/00	01-50					
RESP:	DATA:	REV:	FOLHA:					
DANILO FONTES DE LIMA	ABRIL/2023	00	1/1					

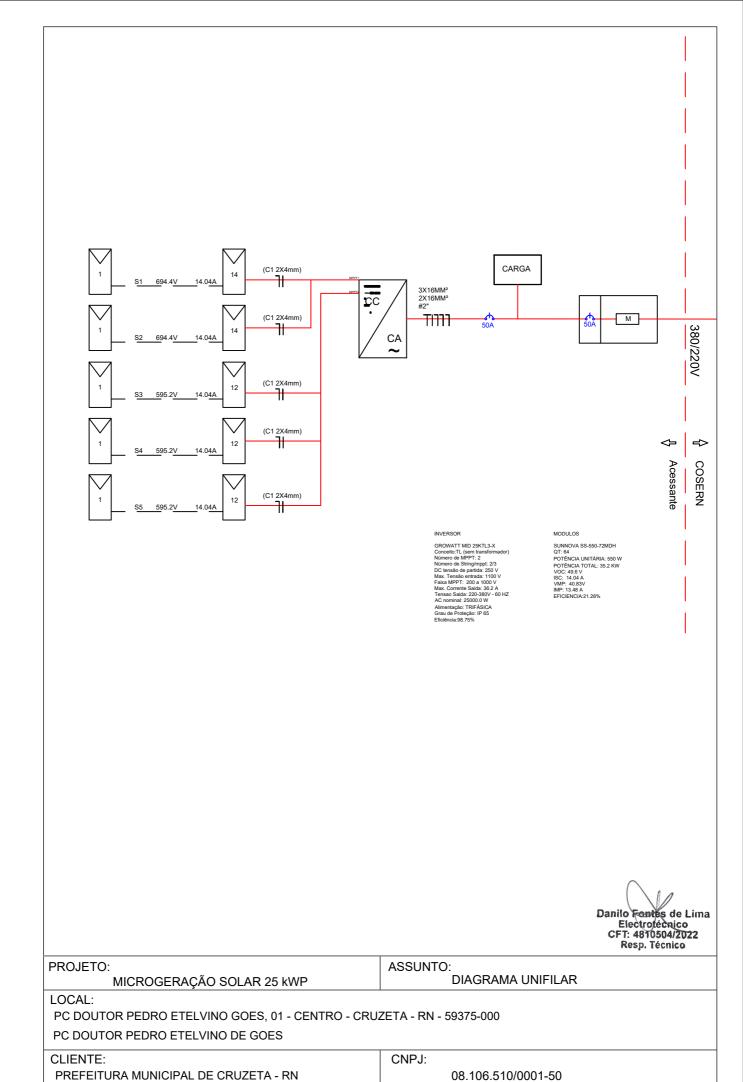

REV:

00

FOLHA:

1/1

RESP:

DANILO FONTES DE LIMA

DATA:

ABRIL/2023
